

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht
Postbus 94370
1090 GJ AMSTERDAM

**Betreft: Reactie op de voortgangsrapportage regionale waterkeringen
2020**

Geacht College,

Volgens de afspraak uit het "Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014", hebben wij van uw waterschap op 08 juni 2021 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2020 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincies Zuid-Holland en Utrecht berichten wij u als volgt.

Verbeteropgave regionale keringen uit 2012

Uit de rapportages van de verschillende waterschappen in West-Nederland blijkt dat vrijwel alle doelen zijn bereikt voor wat betreft de verbeteropgave voor 2020 (die volgde uit de afkeur in 2012). Er is in de periode 2012-2020 in totaal 1350 km regionale kering verbeterd. Eind 2020 voldoet daarmee 72% van het totaal aantal kilometers regionale keringen in West-Nederland aan de gestelde veiligheidsnorm.


Een belangrijke mijlpaal voor de meeste waterschappen was de afspraak om in 2020 alle afgekeurde regionale keringen uit 2012 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Met een aantal waterschappen zijn vanwege de complexiteit van het gebied of het grote areaal gefaseerde afspraken gemaakt voor verbetering tot 2024 en 2030. Ook voor deze termijnen liggen de doelen grotendeels op koers. Tussentijds is door gedeputeerde staten aan drie waterschappen uitstel verleend voor verbetering tot na 2020. Het betreft echter een gering aantal kilometers die minder urgent zijn maar liggen in een complex stedelijke omgeving en/of moeten wachten op een mee koppelkans. De waterveiligheidsrisico's worden hier met extra afspraken beheerst. Financieel zijn er geen knelpunten opgetreden zodat er ook geen onnodige vertraging is ontstaan. De waterschappen hebben in 2020 ongeveer €69M uitgegeven aan toetsing en versterking van de regionale keringen.

In uw waterschap Amstel, Gooi en Vecht voldoet in 2020 in totaal 77% van alle regionale keringen aan de normen op basis van de toetsing van 2012. We zijn verheugd en spreken onze waardering uit dat ondanks "corona" en de stikstof problematiek de voorgenomen verbeterprojecten op schema zijn gebleven.

Uw waterschap is een van de waterschappen waarvoor tussentijds uitstel is verleend voor het verbeterprogramma van de afgekeurde regionale keringen uit 2012. Het gaat in uw geval om een uitstel tot en met 2024. In uw voortgangsrapportage geeft u aan dat het zo goed als zeker dat de

uitvoering van het Uitvoeringsprogramma eind 2024 niet afgerond is. Door de gebiedsgerichte aanpak verwacht u dat er circa 60 km resteert. Hiervan bevindt zich ca. 85% in de provincie Noord-Holland.

Zoals u in de voortgangsrapportage ook al aangeeft, hebben we als provincies op ambtelijke niveau meerdere malen uitgebreid gesproken met uw waterschap over de redenen en de consequenties van het niet afronden van het uitvoeringsprogramma 2024. Uit die gesprekken kwam naar voren dat het in werkelijkheid niet gaat om 60 km, maar om kleine onderdelen, die behoren tot dijktrajecten met een totale lengte van 60 km. Verder kwam naar voren dat uitstel van sommige verbeterprojecten veel kostenbesparende voordelen kunnen opleveren en dat door extra risicobeheersmaatregelen, de dijkveiligheid daarbij in alle gevallen niet in het geding is. Gezamenlijk is er afgesproken, dat op basis van de nieuwste inzichten, uw waterschap in het najaar 2021 komt met een nieuw gedetailleerde planningsvoorstel, waar ook de resultaten van de gesprekken met de provincies in zijn verwerkt. We hebben op basis van de gesprekken met de gedetailleerder informatie-uitwisseling en de gemaakte afspraken er alle vertrouwen in dat uw waterschap zonder extra veiligheidsrisico's de totale dijverbeteringsopgave kort na 2024 zal gaan afronden.

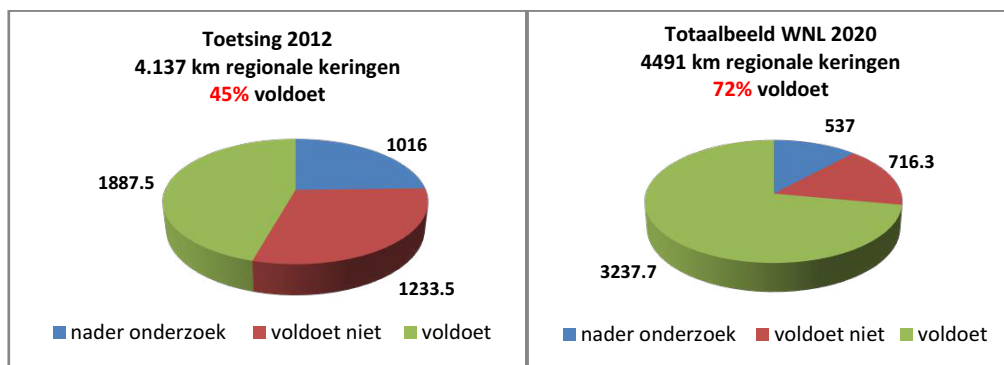

Overzicht voortgang verbeteringsopgave West-Nederland

Voortgang tweede toets ronde regionale keringen 2024

De uitvoering van de tweede toets ronde 2024 regionale keringen ligt bij alle waterschappen op koers. Voor het eerst worden nu ook kunstwerken (zoals gemalen, sluizen en inlaten) en niet waterkerende objecten (bomen, bebouwing en kabels & leidingen) getoetst. Wel zijn er door enkele waterschappen zorgen uitgesproken of alle onderdelen van de toetsing helemaal op tijd afgerond kunnen worden. Dit geldt met name voor de nieuwe toets onderdelen "niet waterkerende objecten" en "kunstwerken". Hier moet namelijk veelal via automatisering van het proces een versnelling komen maar dit vergt dan wel weer voldoende capaciteit om de systemen te vullen. De toetsing van het onderdeel "kabels en leidingen" kan ook lastig worden vanwege de veelheid aan data die verzameld moet worden in combinatie met de vele verschillende eigenaren. Daarbij speelt vooral bij uw waterschap Amstel Gooi en Vecht ook nog de extra aandacht en inspanningen rondom digitale veiligheid.

Als provincies zijn we bewust van het feit dat de automatiseringstrajecten soms nog onzeker zijn hoe dat gaat uitpakken en dat het kan betekenen dat tzt alsnog moet worden terug gegrepen op het handmatig uitvoeren van de toetsing. De provincies willen dan ook graag samen met de waterschappen hier goed aandacht aan blijven besteden. Onder andere via gezamenlijke

expertsessies en/of andere kennisdeling. De bereidheid onder de waterschappen en provincies om hiervoor samen te werken in West-Nederland is groot.

Risicobeheersing waterveiligheid

In 2020 zijn er in West-Nederland geen actuele waterveiligheidsrisico's opgetreden vanwege droogte en/of hoogwaterstanden bij regionale keringen. De waterschappen hebben hun bedrijfsvoering veelal aangepast op basis van inspectierondes met een aanpak op basis van urgentie. Indien noodzakelijk wordt opgeschaald naar de calamiteitenorganisatie. Daarnaast wordt er veel geoefend op calamiteitenbestrijding in samenwerking met de omgeving.

Het is goed om te lezen dat aan het lage plekken plan, dat sinds 2018 door uw Waterschap Amstel Gooi en Vecht is opgestart, in 2020 een vervolg is gegeven, door ze mogelijk op te nemen in een aantal dijkversterkingsprojecten. Juist nu we dit jaar weer te maken hebben gehad met extreme neerslag, wordt nog eens zichtbaar dat juist op deze lage plekken extra overloop kan optreden.

Goed werk!

De waterschappen in West-Nederland laten zien dat ze de afspraken over hun opgaven goed hebben opgepakt waardoor de afgesproken doelen voor 2020 vrijwel zijn bereikt of voor latere perioden grotendeels op koers liggen. Ondanks de soms wat mindere efficiency op project niveau vanwege Corona en de Stikstof perikelen zijn er niet of nauwelijks grote vertragingen in de uitvoering ontstaan. Wij bedanken u daarom voor uw inzet op de waterveiligheid en de samenwerking met ons. Wij wensen u veel succes in de volgende fase met de uitvoering van de afspraken voor de periode 2024-2030 en zien dit met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

Kopie aan Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland.

