



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten



Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2021-775378869
DOS-2017-0005054

Uw kenmerk
-
Bijlagen

Aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van
het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM

Onderwerp
Reactie op de voortgangsrapportage regionale
waterkeringen 2020

Geacht college,

Volgens de afspraak uit het "Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014" hebben wij van uw waterschap op 23 juni 2021 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 2020 ontvangen. Hierover berichten wij u als volgt.

Verbeteropgave West-Nederland afgekeurde regionale keringen uit 2012

Uit de rapportages van de verschillende waterschappen in West-Nederland blijkt dat vrijwel alle doelen zijn bereikt voor wat betreft de verbeteropgave voor 2020 (die volgde uit de afkeur in 2012). Er is in de periode 2012-2020 in totaal 1350 km regionale kering verbeterd. Eind 2020 voldoet daarmee 72% van het totaal aantal kilometers regionale keringen in West-Nederland aan de gestelde veiligheidsnorm.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.


Een belangrijke mijlpaal voor de meeste waterschappen was de afspraak om in 2020 alle afgekeurde regionale keringen uit 2012 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Met een aantal waterschappen zijn vanwege de complexiteit van het gebied of het grote areaal gefaseerde afspraken gemaakt voor verbetering tot 2024 en 2030. Ook voor deze termijnen liggen de doelen grotendeels op koers. Tussentijds is door gedeputeerde staten aan drie waterschappen uitstel verleend voor verbetering tot na 2020. Het betreft echter een gering aantal kilometers die minder urgent zijn maar liggen in een complex stedelijke omgeving en/of moeten wachten op een mee koppelkans. De waterveiligheidsrisico's worden hier met extra afspraken beheerst. Financieel zijn er geen knelpunten opgetreden zodat er ook geen onnodige vertraging is ontstaan. De waterschappen hebben in 2020 ongeveer €69M uitgegeven aan toetsing en versterking van de regionale keringen.

In uw waterschap Schieland en de Krimpenerwaard voldoet in 2020 in totaal ca. 99% van alle regionale keringen aan de veiligheidsnormen. In uw voortgangsrapportage geeft u aan een eigen



redeneerlijn op te willen stellen voor de toets sporen bebouwing en inlaten. Dit ter bespreking met de provincie. Wij treden hierover graag met u in overleg.

Overzicht voortgang verbeteringsopgave West- Nederland

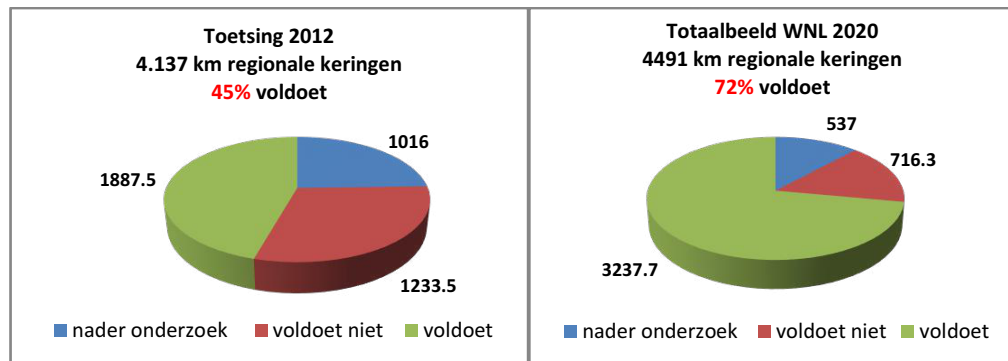

Voortgang tweede toets ronde regionale keringen 2024

De uitvoering van de tweede toets ronde 2024 regionale keringen ligt bij alle waterschappen op koers. Voor het eerst worden nu ook kunstwerken (zoals gemalen, sluizen en inlaten) en niet waterkerende objecten (bomen, bebouwing en kabels & leidingen) getoetst. Wel zijn er door enkele waterschappen zorgen uitgesproken of alle onderdelen van de toetsing helemaal op tijd afgerond kunnen worden. Dit geldt met name voor de nieuwe toets onderdelen “niet waterkerende objecten” en “kunstwerken”. Hier moet namelijk veelal via automatisering van het proces een versnelling komen maar dit vergt dan wel weer voldoende capaciteit om de systemen te vullen. Dat is soms nog onzeker hoe dat gaat uitpakken. De toetsing van het onderdeel “kabels en leidingen” kan ook lastig worden vanwege de veelheid aan data die verzameld moet worden in combinatie met de vele verschillende eigenaren. De provincies willen hier samen met de waterschappen goed aandacht aan blijven besteden. Onder andere via gezamenlijke expertsessies en/of andere kennisdeling. De bereidheid onder de waterschappen en provincies om hiervoor samen te werken in West-Nederland is groot.

Risicobeheersing waterveiligheid

In 2020 zijn er in West-Nederland geen actuele waterveiligheidsrisico's opgetreden vanwege droogte en/of hoogwaterstanden bij regionale keringen. De waterschappen hebben hun bedrijfsvoering veelal aangepast op basis van inspectierondes met een aanpak op basis van urgentie. Indien noodzakelijk wordt opgeschaald naar de calamiteitenorganisatie. Daarnaast wordt er veel geoefend op calamiteitenbestrijding in samenwerking met de omgeving.

Goed werk!

De waterschappen in West-Nederland laten zien dat ze de afspraken over hun opgaven goed hebben opgepakt waardoor de afgesproken doelen voor 2020 vrijwel zijn bereikt of voor latere perioden grotendeels op koers liggen. Ondanks de soms wat mindere efficiency op project niveau vanwege Corona en de Stikstof perikelen zijn er niet of nauwelijks grote vertragingen in de uitvoering ontstaan. Wij bedanken u daarom voor uw inzet op de waterveiligheid en de

samenwerking met ons. Wij wensen u veel succes in de volgende fase met de uitvoering van de afspraken voor de periode 2024-2030 en zien dit met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
