

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "Natuurgebied Ruygeborg II – Fase 1"

ONDERGETEKENDEN:

1. **Provincie Zuid-Holland**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Berend Potjer, daartoe rechtsgeldig gemachtigd door de Commissaris van de Koning, handelend ter uitvoering van het besluit van het Gedeputeerde Staten van 21 mei 2024, hierna te noemen: "Provincie"

en

2. **Natuurmonumenten**, gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudend op het adres Stationsplein 1 (3818 LE) te Amersfoort, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: "Natuurmonumenten"

De ondergetekenden tezamen ook wel aangeduid als: "Partijen"

OVERWEGENDE DAT:

1. Provincie en Natuurmonumenten de intentie hebben om ten behoeve van het behalen van de beoogde natuurbeheertypen, zoals kruiden- en faunarijck grasland, vochtig weidevogelgrasland en dynamisch moeras, een natuurgebied te realiseren tussen de Natura 2000 gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en het natuurgebied de Groene Jonker en Ruygeborg I. (locatie Ruygeborg II, hierna te definiëren als: '**Natuurgebied**') als onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (hierna te definiëren als '**NNN**');
2. de noodzaak en wenselijkheid van deze maatregel voortvloeit uit de wens van het Rijk om het NNN invulling te geven. Daaruit voortvloeiend is, door de Provincie en onder regie van het Programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke (hierna te definiëren als: '**Programmabureau**'), het Veenweideprogramma voor het gebied Gouwe Wiericke vastgesteld, waar de locatie Bodegraven Noord onderdeel van uitmaakt. Met dit programma wordt de inrichting van natuur gecombineerd met de overige opgaven voor het veenweidegebied ten aanzien van bodem, waterhuishouding, recreatie, landbouw en het landschap;
3. provincie afspraken met het Rijk heeft gemaakt over oplevering van het NNN uiterlijk in 2027 en Natuurmonumenten en provincie hieraan tijdige invulling wensen te geven
4. teneinde het beoogde Natuurgebied te kunnen realiseren en de beoogde natuurbeheertypen te behalen bepaalde ingrepen nodig zijn conform het plan voor de inrichting van het Natuurgebied (hierna te definiëren als '**Definitief Ontwerp**', door de Stuurgroep vastgesteld op 6 juni 2023 en zoals bijgevoegd in **bijlage 1**);
5. Partijen afspraken vastleggen of hebben vastgelegd, over uit te ruilen en te verwerven gronden; in deze overeenkomst, in de hierna genoemde ruilovereenkomst en de hierna genoemde koopovereenkomst.
6. Natuurmonumenten het grootste gedeelte van het Plangebied in eigendom heeft.
7. Een ruilovereenkomst is gesloten tussen Provincie, Natuurmonumenten en een particulier eigenaar, waarin is vastgelegd dat het particuliere eigendom binnen het Plangebied na inrichting in eigendom komt bij Natuurmonumenten.
8. Provincie Zuid-Holland voornemens is de resterende gronden binnen het Plangebied aan Natuurmonumenten te verkopen en te leveren en dit voornemen te publiceren (met inbegrip van de gronden waarvoor reeds een koopovereenkomst tussen partijen gesloten is), met als enig

voorbehoud eventuele juridische beperkingen als gevolg van de te doorlopen stappen in het kader van het Didam-arrest.

9. Partijen voornemens zijn een “fase 2” in later stadium overeen te komen. Dit zal in een separate overeenkomst/addendum worden opgenomen.
10. Vanuit het Programmabureau, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet, gemeente Nieuwkoop, Natuurmonumenten en een onafhankelijk ingenieursbureau er stapsgewijs is gewerkt aan het Definitief Ontwerp;
11. Natuurmonumenten akkoord is met het Definitief Ontwerp en de kennis en ervaring heeft ten aanzien van zowel de inrichting als het beheer en onderhoud van het Natuurgebied en deze kennis ook wil inbrengen;
12. Het Plangebied momenteel gedeeltelijk wordt gebruikt door agrariërs via pachtcontracten (en daarmee restricties kent ten aanzien van maaidata, bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen) en gedeeltelijk ook voor weidevogelbeheer waaronder een rustperiode in het broedseizoen;
13. Provincie de Stuurgroep opdracht heeft gegeven om de inrichting te laten realiseren. Provincie heeft kennisgenomen van het Definitief Ontwerp en is tevreden met het door de Stuurgroep vastgestelde ontwerp. Provincie constateert dat het Definitief Ontwerp ook aan haar kaders en doelstellingen voldoet;
14. Partijen als partners samenwerken in een gebiedsproces met de intentie om agrariërs en natuurbeheerders als goede burensamen te laten werken; en
15. Partijen nadere afspraken wensen te maken over de voorbereiding, uitvoering en financiële dekking alsmede de juridische verankering van het gebruik van de gronden tijdens de Inrichtingsfase. En Partijen willen deze afspraken in onderhavige Overeenkomst schriftelijk vastleggen.
16. In lijn met artikel 5.12 van de overeenkomst van kavelruil d.d. 28 – 02 – 2024 tussen Provincie Zuid-Holland, dhr. A.M. Kuijf en Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, partijen genoegzaam bekend, zal Natuurmonumenten tijdelijk percelen binnen het Natuurgebied ter beschikking stellen aan de betreffende partij, ten behoeve van de beweiding van paarden. Dit geschiedt in praktische afstemming met de betrokken partijen.

KOMEN ALS VOLGT MET ELKAAR OVEREEN:

Artikel 1 Definities en doelstelling

1.1 In deze Overeenkomst wordt hierna verstaan onder:

AGV	Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Bestuurlijk Overleg	Overleg bestaande uit nog nader te benoemen bestuurders van Partijen.
Definitief Ontwerp	Inrichtingsplan 06-06-2023 zoals opgenomen als bijlage 1 bij de Overeenkomst.
HHR	Hoogheemraadschap van Rijnland
Inrichtingsfase	Fase van de Overeenkomst waarin onder andere de inrichtingswerkzaamheden door de aannemer plaatsvinden. Deze fase eindigt bij oplevering door de aannemer, die mogelijk gefaseerd gaat plaatsvinden.
Overzichtskartaat plangebied	De kaart die als bijlage 2 bij de Overeenkomst is gevoegd.
Natuurgebied	Het te realiseren stuk natuur tussen de Natura 2000 gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Groene Jonker als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

NNN	Natuurnetwerk Nederland.
Overeenkomst	Onderhavige samenwerkingsovereenkomst.
Partijen	De partijen bij onderhavige Overeenkomst, te weten de Provincie en Natuurmonumenten.
Plangebied	Het gebied waarbinnen het Natuurgebied wordt gerealiseerd, een en ander aangegeven op de Kaart en conform het Definitief Ontwerp.
Programmabureau	Programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke, ingesteld door de Stuurgroep Gouwe Wiericke.
Projectgroep	Overlegorgaan waaraan nog nader te benoemen vertegenwoordigers van Partijen deelnemen. Hier vindt onder andere de afstemming over de werkzaamheden plaats.
Ruygeborg I	Reeds ingericht gebied, aangegeven op de kaart. Binnen dit gebied vinden ook werkzaamheden plaats, onderdeel van de overeenkomst
Ruygeborg II – Fase 2	, wordt op een later moment uitgewerkt en gerealiseerd.

- 1.2 Partijen leggen in deze Overeenkomst de afspraken vast:
- over de wijze waarop ze samenwerken tijdens de Inrichtingsfase;
 - wie welke taak, verantwoordelijkheid en bijbehorende financiële verplichtingen op zich neemt tijdens de Inrichtingsfase;
 - ten opzichte van bijbehorende besluitvorming; en
 - het aanvragen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en het doen van meldingen conform het Definitief Ontwerp.
- 1.3 Partijen beogen dat met de realisatie van het Natuurgebied conform het Definitief Ontwerp, de volgende resultaten worden bereikt:
- het behalen van de beoogde natuurbeertypen zoals beschreven in het Definitief Ontwerp;
 - het Natuurgebied geschikt te laten zijn voor de beoogde doelsoorten zoals beschreven in het Definitief Ontwerp;
 - het komen tot een ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse plassen en De Groene Jonker; en
 - dat het Natuurgebied redelijkerwijs (qua kosten en wijze van uitvoering) te beheren is zodat aan de natuurdoelstellingen voldaan kan blijven worden.

Artikel 2 Invulling van het Natuurgebied

- 2.1 Het Natuurgebied wordt gerealiseerd binnen het Plangebied, overeenkomstig het Definitief Ontwerp.

Artikel 3 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en overleg

Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De Provincie is (eind-)verantwoordelijk voor:
- het inrichten van het Natuurgebied conform Definitief Ontwerp;
 - het projectmanagement tijdens de Inrichtingsfase;
 - de opdrachtverstrekking voor de inrichtingswerkzaamheden overeenkomstig het Definitief Ontwerp;
 - het opstellen van het bestek c.q. de aanneemovereenkomst;
 - de aanbesteding volgens het aanbestedingsbeleid van de Provincie;
 - afstemming met belanghebbenden en het bevoegd gezag;

- g. het aanvragen van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen en het doen van meldingen; en
- 3.2 Natuurmonumenten verleent door ondertekening van deze Overeenkomst en voor zover nodig, toestemming (T) danwel machtiging (M) aan de Provincie om de werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van het Natuurgebied, uit te voeren. Deze toestemming (T) danwel machtiging (M) ziet in ieder geval op het volgende :
- a. de aanbesteding zoals beschreven in artikel 4.1 (T);
 - b. het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen, overige besluiten en het doen van meldingen ten behoeve van de inrichting van het Natuurgebied conform het Definitief Ontwerp, waarbij Provincie de afgegeven (ontwerp) vergunningen en/of ontheffingen en overige besluiten binnen twee weken na afgifte aan Natuurmonumenten zal overhandigen (M);
 - c. inrichting van het Natuurgebied, op alle percelen die Natuurmonumenten in eigendom heeft of die zij vooraf of gedurende de inrichtingsfase in eigendom krijgt, conform het Definitief Ontwerp (T);
 - d. e allen tijde toegang tot de benodigde delen van haar gronden in het Plangebied (T);
 - e. Het vestigen van een kwalitatieve verplichting op basis van de kwalitatieve verplichting die bij een SKNL-subsidie wordt gevestigd **bijlage 3**) op alle percelen die zij in het Natuurgebied in eigendom heeft of krijgt (M).
- 3.3 Natuurmonumenten is (eind-)verantwoordelijk voor:
- a. aanvullende advisering bij de inrichting van het Plangebied;
 - b. het ter beschikking stellen van de gronden en sloten die ze in eigendom heeft ten behoeve van de inrichtingswerkzaamheden.
- Specifieker adviseert en denkt Natuurmonumenten mee over:
- de planning, aanpak, kansen en risico's;
 - de ecologische vraagstukken rondom de inrichting van het Plangebied;
 - het bestek ten behoeve van de aanbestedingsprocedure;
 - tekst ten behoeve van het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen;
 - de inrichting, beheer en uitvoerbaarheid;
 - de communicatie vanuit de positie van Natuurmonumenten.
- 3.4 Partijen stellen voldoende capaciteit en expertise beschikbaar voor de uitvoering van genoemde taken, dan wel voor de begeleiding van een uitbesteding van deze taken.
- 3.5 Partijen verplichten zich jegens elkaar ertoe om de noodzakelijke inspanningen te verrichten om de inrichting van het Natuurgebied binnen de geplande termijn, met als beoogde einddatum 31 december 2027, te realiseren.
- 3.6 Partijen stellen elkaar onverwijld en volledig in kennis omtrent feiten, documenten, inzichten en ontwikkelingen, die van belang zijn of kunnen zijn voor het correct uitvoeren van deze Overeenkomst. Partijen delen die documenten met de andere Partij die nodig zijn voor de interne archiveringsplicht van elke Partij.
- 3.7 Partijen werken ten volle mee aan alle (rechts-)handelingen en toestemmingen die benodigd zijn, zoals voor het verkrijgen van de vergunningen en/of ontheffingen, dan wel andere publiekrechtelijke toestemmingen die benodigd zijn voor ontwikkeling en inrichting van het Natuurgebied conform het Definitief Ontwerp. Indien nodig treden Partijen via de Projectgroep in overleg.
- 3.8 Natuurmonumenten stelt de benodigde delen van haar gronden kosteloos beschikbaar voor de Inrichting van het Natuurgebied.

Overleg

- 3.9 Ten behoeve van de Inrichtingsfase wordt een Projectgroep ingesteld. De Projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Partijen. Deze Projectgroep komt tenminste eens in de twee maanden bijeen. Vertegenwoordigers van de Partijen bepalen in onderling overleg de agenda van elk werkoverleg en kunnen naar eigen inzicht adviseurs bij het overleg uitnodigen.
- 3.10 Ten behoeve van de Inrichtingsfase wordt een Bestuurlijk Overleg ingesteld. Dit Bestuurlijk Overleg komt op zijn minst bij de start en aan het einde van de Inrichtingsfase bij een.

Artikel 4 Inrichtingsfase

- 4.1 Provincie is opdrachtgever van de aannemer die de inrichtingswerkzaamheden zal uitvoeren. Natuurmonumenten verleent door ondertekening van deze Overeenkomst toestemming aan de Provincie om het volledige inkoop-, aanbesteding- en uitvoeringsproces te verzorgen betreffende de inrichting van het Natuurgebied, waaronder begrepen het besluit tot gunning. Met de aannemer zal een vooropname worden gedaan, beide Partijen zijn hierbij aanwezig.
- 4.2 Provincie stelt het bestek pas vast na inwinning van advies van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten conformeert zich vervolgens aan het bestek.
- 4.3 Natuurmonumenten zorgt ervoor dat de (eerdere) pachtcontracten geen beperkingen opleveren voor de inrichtingswerkzaamheden van de aannemer. Daartoe meldt Provincie schriftelijk uiterlijk 11 weken voor de start van de inrichtingswerkzaamheden op een perceel, aan Natuurmonumenten, wanneer de inrichtingswerkzaamheden op dat perceel zullen plaatsvinden, zodat Natuurmonumenten eventuele pacht- en/of gebruiksovereenkomsten tijdig kan opzeggen. Indien de Grondkamer niet akkoord gaat met een opzegtermijn van 2 maanden voor de pachtcontracten, treden partijen met elkaar in overleg.
- 4.4 Uiterlijk 6 weken na de melding als bedoeld in artikel 4.3 doen partijen een gezamenlijke nulmeting ten aanzien van het beheer, om te constateren of het beheer van de percelen en sloten door de aannemer kan worden overgenomen. Daarbij is het uitgangspunt dat percelen gemaaid zijn en de sloten geschoond van begroeiing, zoals verwacht mag worden op basis van de beheerafspraken onder artikel 4.5. Tevens wordt geconstateerd of de sloten voldoende gebaggerd zijn en daarmee voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften van AVG en HHR. Indien nodig voert Natuurmonumenten nog aanvullend beheer uit, voordat het beheer overgaat naar PZH. Indien dit een knelpunt oplevert treden partijen in overleg.
- 4.5 Provincie is verantwoordelijk voor het groenbeheer van sloten en percelen (uitgezonderd baggeren) vanaf de start van de inrichtingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.3. Het beheer dient als volgt plaats te vinden:
- a. Beheer dient gedaan te worden op gebieden die na inrichting het beheertype kruiden- en faunarijck grasland óf vochtig weidevogelgrasland krijgen.
 - b. Beheer bestaat uit 2 maairondes. De eerste maaironde dient tussen 15 juni en 15 juli uitgevoerd te worden. De tweede maaironde dient tussen 15 augustus en 15 september uitgevoerd te worden.
 - c. Het maaisel dient afgevoerd te worden.
 - d. De sloten dienen geschoond te worden van begroeiing tussen 15 september en 1 november. Het vrijgekomen materiaal dient afgevoerd te worden.
- 4.6 De nameting ten aanzien van het afgesproken beheer vindt plaats bij de eindoplevering, zoals beschreven in artikel 4.10.
- 4.7 Natuurmonumenten heeft er kennis van genomen dat het overdragen van het beheer naar de Provincie van invloed zal zijn op de door Natuurmonumenten (te) ontvangen subsidie uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Natuurmonumenten dient hierover zelf tijdig contact op te nemen en de wijzigingen in het beheer danwel de subsidiabele activiteiten door te geven aan de subsidieverstrekker conform de voorwaarden behorende bij de subsidiebeschikking.

- 4.8 Voor de inrichtingswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van bestaande paden naar en in het Natuurgebied welke in eigendom zijn van Natuurmonumenten of waar Natuurmonumenten een recht van overpad heeft. Alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt een nul-meting uitgevoerd en vastgelegd. Na uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden herstelt Provincie deze paden in oorspronkelijke staat, conform nul-meting.
- 4.9 Oplevering zal door de aannemer plaatsvinden aan de Provincie. Natuurmonumenten werkt mee aan de inventarisatie van de restpunten (wat de aannemer achterlaat na de inrichting), is aanwezig bij de oplevering en ondertekent mede het proces-verbaal. Partijen bespreken via de Projectgroep hoe de restpunten worden uitgevoerd. De doorlopende rechten en plichten uit de aanneemovereenkomst worden na de oplevering in overleg tussen Partijen aan Natuurmonumenten overgedragen.
- 4.10 Eventuele waardevermindering danwel waardevermeerdering van de gronden is voor rekening van Natuurmonumenten.

Artikel 5 Verdere financiële afspraken

Algemeen

- 5.1 Gedurende het gehele project is de inzet van interne arbeidscapaciteit door een Partij, voor eigen rekening van die Partij.
- 5.2 Provincie draagt de kosten van de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van de Inrichtingsfase, een en ander als bedoeld in artikel 3.1 en artikel 4 van deze Overeenkomst, met inachtneming van hetgeen gesteld in artikel 5.1.

Artikel 6 Afwijking op het Definitief Ontwerp

- 6.1 Als na inwerkingtreding van de Overeenkomst blijkt dat van het Definitief Ontwerp dient te worden afgeweken dan treden Partijen met elkaar binnen de Projectgroep in overleg om te trachten tot overeenstemming te komen over de aanpassing van het Definitief Ontwerp. Een afwijking kan zijn, maar is niet beperkt tot: een wijziging, danwel het niet realiseren van een deel van het DO. Een afwijking om wat voor reden dan ook behoeft goedkeuring van beide Partijen, waarbij wordt gestreefd om zoveel mogelijk binnen de gestelde bouwkosten conform het Definitief Ontwerp te blijven.
- 6.2 Bij significante afwijking op het Definitief Ontwerp maakt de Projectgroep een wijzigingsvoorstel waar beide Partijen mee akkoord gaan.
- 6.3 Bij excessieve, onverwachte gebeurtenissen trachten Partijen in goed overleg, via de Projectgroep, gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 7 Communicatie

- 7.1 Provincie voert ten behoeve van de voorbereiding en inrichting van het Natuurgebied primair het contact met derden, met inachtneming van hetgeen in de artikelen 7.4 en 7.5 is bepaald. Natuurmonumenten spant zich in om daar waar nodig bij te dragen aan de communicatie en zet desgewenst haar communicatiekanalen in.
- 7.2 Wanneer openbare communicatie ten aanzien van (de inrichting van) het Natuurgebied via de media plaatsvindt, gebeurt dat enkel afgestemd met en goedgekeurd door de andere Partij.
- 7.3 Partijen zullen in hun externe communicatie (mondeling en schriftelijk) naar derden ten aanzien van (de inrichting van) het Natuurgebied hun samenwerking op een duidelijke wijze kenbaar maken.

- 7.4 Als uitzondering op artikel 8.1 voert Natuurmonumenten voor en na de Inrichtingsfase primair het contact met haar pachters als het bijvoorbeeld gaat om toegang tot de gronden en de inhoud van de pachtovereenkomst.
- 7.5 Natuurmonumenten informeert de pachters over afspraken die met Provincie zijn gemaakt en de wijze waarop met hen gecommuniceerd wordt tijdens de looptijd van deze Overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

- 8.1 Aansprakelijkheid voor schade van Natuurmonumenten en derden, die ten gevolge van de inrichtingswerkzaamheden ontstaat, ligt bij de Provincie, behoudens indien de schade is ontstaan vanwege opzet of grove schuld van Natuurmonumenten danwel derden (niet zijnde de partijen die de inrichtingswerkzaamheden hebben uitgevoerd).
- 8.2 De aansprakelijke partij vrijwaart de andere partij tegen aanspraken van derden.
- 8.3 Provincie draagt er zorg voor dat een CAR-verzekering ten behoeve van de inrichtingswerkzaamheden wordt afgesloten.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

- 9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 9.2 Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om tussen hen gerezen geschillen over uitleg of toepassing van deze Overeenkomst in minnelijk overleg op te lossen. Indien en voor zover Partijen niet binnen een redelijke termijn tot overeenstemming komen in minnelijk overleg en pas nadat dit geschil in het Bestuurlijk Overleg is besproken, is de meest gereede partij gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde Burgerlijke rechter.

Artikel 10 Ingebrekestelling en verzuim

- 10.1 Partijen zijn in verzuim indien zij, na ingebreke te zijn gesteld, nalatig zijn of blijven de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk bij aangetekende brief met inachtneming van een termijn van eenentwintig dagen.

Artikel 11 Diversen

- 11.1 Partijen mogen geen rechten en plichten uit deze overeenkomst aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
- 11.2 De publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de Provincie komt door het bepaalde in deze overeenkomst niet te vervallen.
- 11.3 De Provincie is niet aansprakelijk voor tekortschieten onder deze overeenkomst, indien dit tekortschieten voortvloeit uit een handelen of nalaten van de Provincie waartoe zij op grond van het publiekrecht gehouden is.

Artikel 12 Wijzigingen van de Overeenkomst, nietigheid/vernietigbaarheid en onvoorziene omstandigheden

- 12.1 Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Partijen over de inhoud van de wijziging, alsmede over de gevolgen van de wijziging overeenstemming hebben bereikt.

Wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk door Partijen is vastgelegd en rechtsgeldig is ondertekend door daartoe bevoegde personen.

- 12.2 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven.
- 12.3 Partijen zullen over de bepalingen welke nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, in die zin dat de strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.
- 12.4 Partijen zullen bij onvoorziene omstandigheden overleg plegen, teneinde vervangende afspraken te maken, in die zin dat de strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.

Artikel 13 Duur van de Overeenkomst, tussentijdse ontbinding

- 13.1 Deze Overeenkomst treedt in werking door ondertekening van de Overeenkomst door Partijen.
- 13.2 Deze Overeenkomst eindigt pas als iedere Partij aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
- 13.3 De Provincie is bevoegd de Overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien zij de in artikel 3.1 omschreven taken niet kan uitvoeren door het ontbreken van dekking van de kosten (conform de directieraming 03-04-2024j behorende bij het definitieve bestek,), het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of toestemmingen of als de aanbesteding geen doorgang kan vinden, om welke reden dan ook. Deze bevoegdheid is van toepassing tot het moment van gunning aan de aannemer.
- 13.4 De Provincie zal voorafgaand aan de ontbinding conform artikel 13.3 Natuurmonumenten minimaal twee maanden in de gelegenheid stellen een oplossing aan te dragen. Ingeval de overeenkomst op basis van artikel 13.3 tussentijds wordt ontbonden, draagt iedere Partij de eigen kosten die zijn gemaakt. Tussentijdse ontbinding als hier bedoeld geeft Natuurmonumenten tevens geen enkel recht, ook dus niet op een schadevergoeding/ schadeloosstelling hoe ook genaamd.

Artikel 14 Bijlagen

- 14.1 De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen een bijlage en de Overeenkomst, geldt hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

Bijlage 1	Definitief Ontwerp Ruygeborg II – fase 1, inclusief aanduidingen Ruygeborg I en Ruygeborg II – fase 2
Bijlage 2	Overzichtskaart Plangebied
Bijlage 3	Kwalitatieve verplichtingen SKNL

Handtekeningenpagina volgt

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,

Provincie Zuid-Holland,	
NAAM	
FUNCTIE	
DATUM	
PLAATS	

Natuurmonumenten,	
NAAM	
FUNCTIE	
DATUM	
PLAATS	

Bijlage 1 - Definitief Ontwerp Ruygeborg II – fase 1, inclusief aanduidingen Ruygeborg I en Ruygeborg II – fase 2




Definitief ontwerp Ruygeborg II – fase 1

Binnen groen kader; Ruygeborg I

Binnen rode kaders, rood gearceerd en aangeduid met "2": Ruygeborg II -fase 2

Bijlage 2 - Overzichtskaart Plangebied

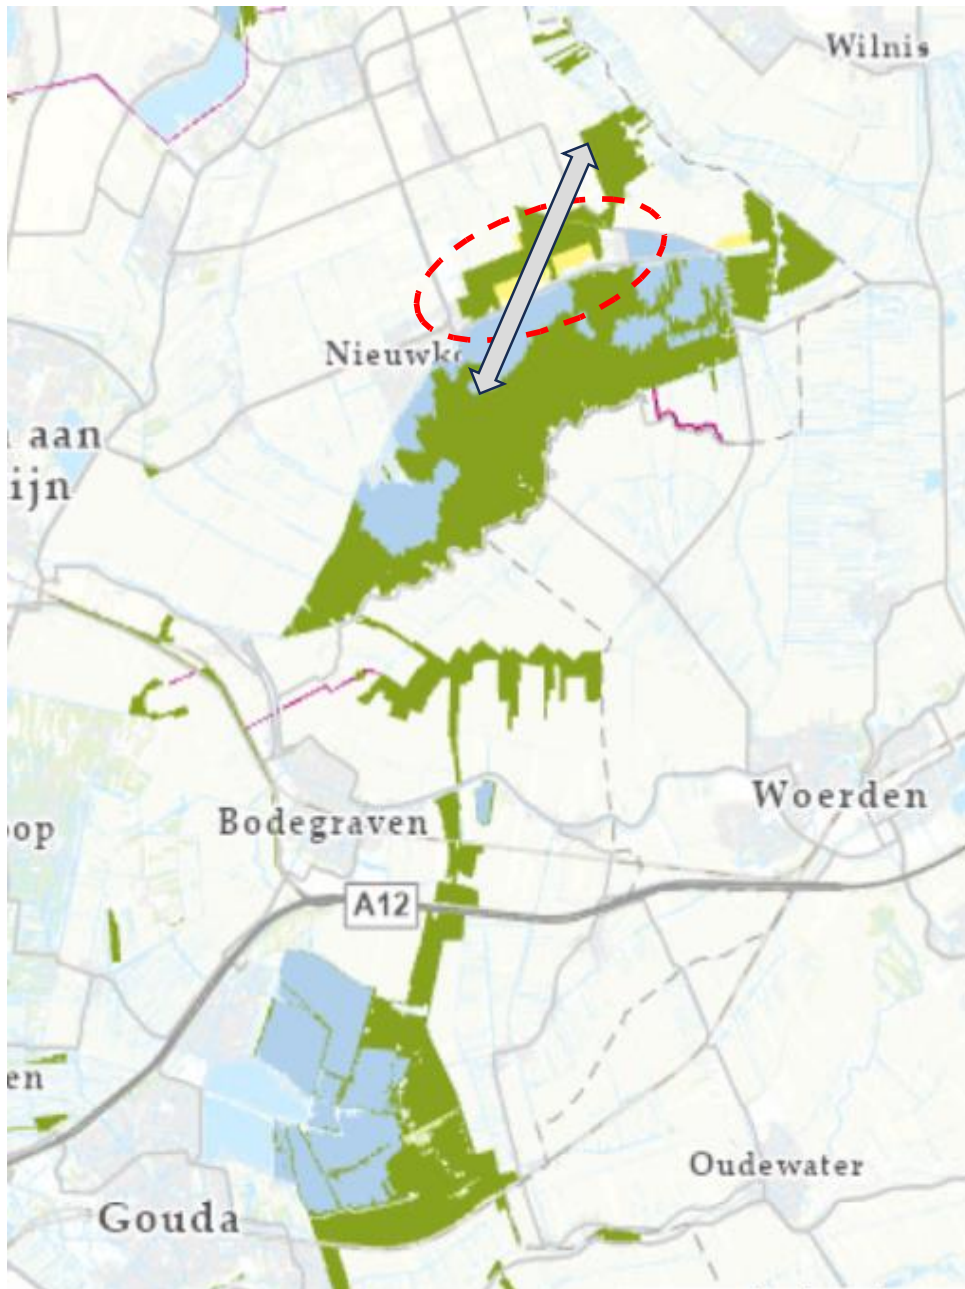

Ligging Ruygeborg ten opzichte van de Nieuwkoopse Plassen en Groene Jonker

Bijlage 3 - Kwalitatieve verplichtingen SKNL
