

# Spoorboekje

Onderwerp: 'Spoorboekje' Warmtetransportleiding Vlaardingen -Den Haag

## Belangrijke data WarmtelinQ:

17-08-2020      **Formele vergunningaanvragen** WarmtelinQ,  
16-09-2020:      **Ontwerpbesluiten gereed** en ontvangen door PZH  
22-10-2020:      Start ter inzage legging ontwerpbesluiten samen met PIP en MER

- e-mail:
- Post: GS van Zuid Holland,  Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
- **of in overleg afleveren** op Provinciehuis Zuid Holland, Den Haag

## LET OP! De belangrijkste kenmerken van de procedure:


1. Provinciale Staten hebben op 18 december 2019 besloten om voor dit project de provinciale coördinatieprocedure (PCR) uit Afd. 3.6.2 Wro toe te passen. Dat betekent dat het provinciale inpassingsplan, het MER en de benodigde vergunningen gecoördineerd (lees = gelijktijdig) worden voorbereid en bekendgemaakt. Voor die vergunningen wordt dus NIET de reguliere vergunningprocedure gevolgd, maar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit Afd. 3.4 van de Awb. Dit vloeit voort uit Afd. 3.6 van de Wro (over coördinatie)
2. Dat betekent o.a. dat eerst een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd waartegen door een ieder zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Daarna volgt het definitieve besluit.
3. Bovendien kunnen de termijnen voor het voorbereiden van de ontwerpbesluiten en definitieve vergunningen afwijken. Deze worden door GS (in goed overleg) bepaald en vastgelegd in de zogenoemde 'termijnbrief' aan de betrokken overheden.
4. Elk bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming op de ingediende aanvragen, GS fungeert daarnaast als coördinerend bevoegd gezag.  
Dat betekent dat dat GS zorgen voor:
  - Coördinatie/gelijktijdige voorbereiding van de benodigde vergunningaanvragen;
  - Coördinatie/gelijktijdige terinzagelegging van (ontwerp-)besluiten;
  - Aanleveren mappen voor de fysieke terinzagelegging op de afgesproken adressen;
  - Digitale terinzagelegging;
  - Kennisgevingen in Staatscourant en in andere media;
  - Postbus (fysiek en digitaal) voor alle zienswijzen en reacties;
  - Verdelen van zienswijzen en reacties over bevoegde gezagen;
  - Verzenden van (ontwerp)besluiten aan aanvrager en indieners van zienswijzen.
5. Ontwerpbesluiten en besluiten worden NIET<sup>1</sup> naar de aanvrager gezonden, maar naar GS! GS dragen zorg voor (gebundelde) toezending aan de aanvrager.
6. Als een aanvraag getoetst moet worden aan een ruimtelijk besluit, dan is dat aan het (provinciaal) inpassingsplan<sup>2</sup> (en dus niet aan het vigerende bestemmingsplan!). Het inpassingsplan wordt gelijktijdig met de vergunningen voorbereid en bekendgemaakt, maar iets eerder vastgesteld dan de (omgevings)vergunning, zodat ernaar kan worden verwezen.
7. Tegen besluiten die met toepassing van de PCR zijn voorbereid, staat geen bezwaar open. In plaats daarvan is er beroep in één instantie, dus direct bij de Raad van State. Hierop is de verkorte afdoeningstermijn van zes maanden van toepassing.

<sup>1</sup> Zie artikel 3.3, lid 4 jo art. 3.31, lid 3 Wro. NB: door toezending aan aanvrager treedt het besluit direct in werking, wat de beroepsprocedure nadelig beïnvloedt.

<sup>2</sup> Zodra het PIP is vastgesteld, maakt het deel uit van de onderliggende bestemmingsplannen (ingevolge artikel 3.33 eerste lid, Wro in samenhang met artikel 3.26, derde lid, Wro)

## Uitvoeringsmodule vergunningen (excl. PIP/MER)

Schematisch overzicht:

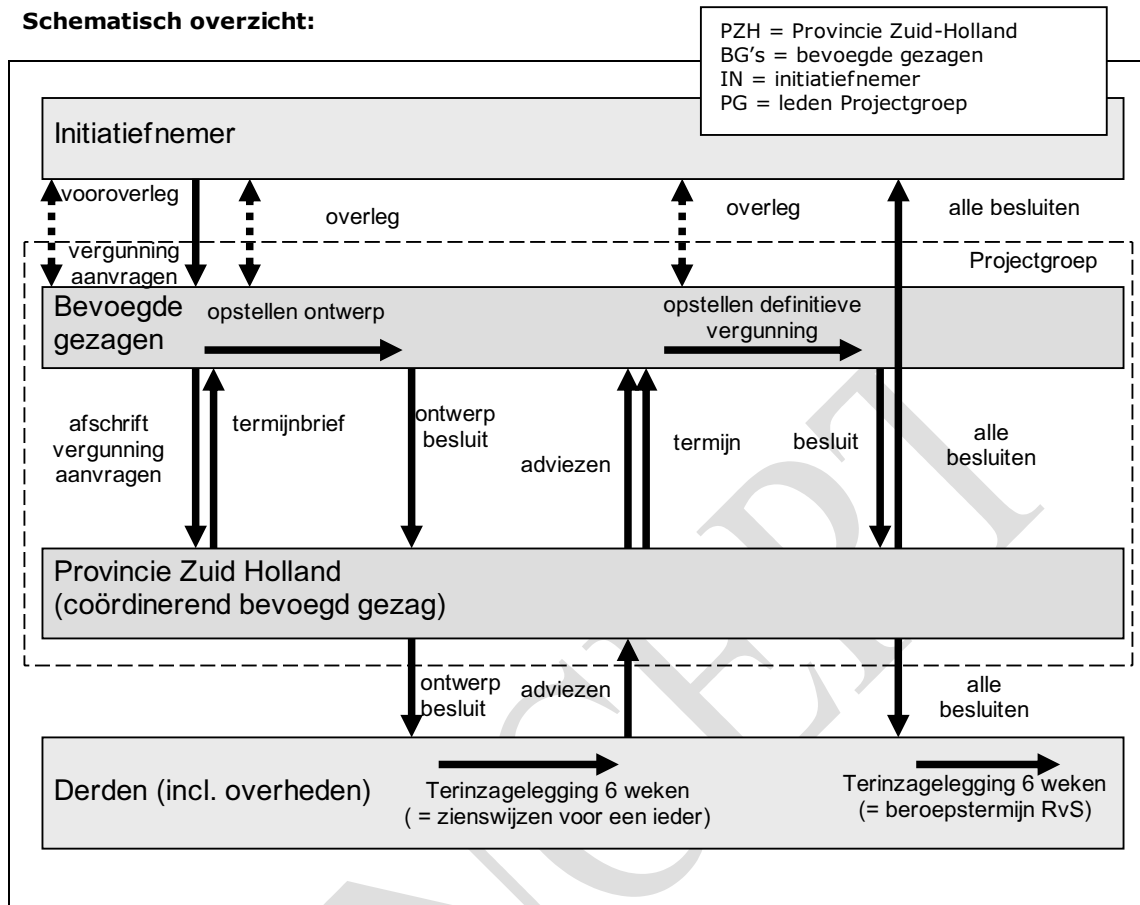

In chronologische volgorde:

Fase ontwerpbesluiten		
Datum	Activiteit	Actie door
Week 24 08-06-2020	Indienen conceptaanvragen bij gemeente(n)	IN
Week 27 29-06-2020	Indienen conceptaanvragen bij <u>overige bevoegde gezagen</u> <sup>3</sup>	IN
Week 24 tot 30 Van 08-06-2020 Tot 24-07-2020	Opstellen (concept-)ontwerpbesluiten Periode waarin om aanvullingen kan worden verzocht Opstellen en aanleveren aanvullingen/ontbrekende onderzoeken	BG IN
Week 31 31-07-2020	Uiterste toezending termijnbrief i.v.m. PCR aan overige bevoegde gezagen	PZH
Week 33 10 augustus 2020	Uiterste datum afronding ontvankelijkheidstoetsen	BG
Week 34 17 augustus	Indienen formele vergunningaanvragen bij gemeenten en overige bevoegde gezagen	IN
Week 34 tot 38 Van 17-08-2020 Tot 16-09-2020	Afronden ontwerpbesluiten en interne besluitvorming bij BG	BG's

<sup>3</sup> Afstemming over rapportage en indieningsvereisten heeft reeds plaatsgevonden, of zal voor 29-06 hebben plaatsgevonden tussen WarmtelinQ en bevoegd gezag. In veel gevallen is BG voor 29-06 reeds in bezit van de stukken voor de aanvraag.

Week 38 16-09-2020	<b>Uiterste datum aanlevering ontwerpbesluiten bij PZH (uiterlijk op datum uit termijnbrief)</b>	BG's
Week 39 tot 41	Besluitvorming door GS over tervisielegging ontwerp-PIP en ontwerpbesluiten PCR	PZH
Week 38 tot 42 Van 16-09-2020 Tot 16-10-2020	Voorbereiding terinzagelegging Controle ontwerpbesluiten Opstellen en plaatsen kennisgevingen tervisielegging ontwerp-PIP en ontwerpbesluiten PCR	PZH/BG/IN
Week 43 tot 49 Van 22-10-2020 Tot 03-12-2020	<b>Terinzagelegging ontwerpbesluiten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stukken op website PZH</li> <li>• analoge sets bij PZH en overige BG's</li> <li>• 1 loket voor zienswijzen bij PZH</li> <li>• Elk BG is verantwoordelijk voor behandeling zienswijzen op eigen besluiten, maar provincie levert ondersteuning</li> </ul>	PZH PZH/BG PZH BG's/PZH
Week 44/45 02-11-2020	2 a 3 informatieavonden: organisatie door PZH, maar aanwezigheid van overige BG's en initiatiefnemer	PZH/IN en BG
<b>Fase definitieve besluiten</b>		
<b>Datum</b>	<b>Activiteit</b>	<b>Actie door</b>
PM	Nadere afstemming over vervolg van de procedure zal plaatsvinden in het 4 <sup>e</sup> kwartaal van 2020	

CONCEPT
